

Logboek

Brandwerende afdichtingen



Passage Boutersem

Brandwerende afdichting ondergrondse
parkeergarage





Inhoudsopgave

Contactgegevens	3
Plattegrond: Ondergrondse parkeergarage	Boutersem 4
Markers uitgevoerde werken	5
Technische documentatie en rapporten	40
Disclaimer	43



Contactgegevens

Project	
Projectbeschrijving	Brandwerende afdichtingen ondergrondse parkeergarage
Naam gebouw	Passage Boutersem
Adres	
Postcode / Plaats	Boutersem
Land	België
Contactpersoon	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Applicatiebedrijf	
Bedrijfsnaam	RPS bv
Adres	Leuerbroek 2060
Postcode / Plaats	3640 Kinrooi
Land	Belgium
Contactpersoon	Sylvie Houbiers
Telefoonnummer	0032 (0)490 44 12 61
E-mailadres	sylvie@r-p-s.be


Opdrachtgever	
Bedrijfsnaam	
Adres	
Postcode / Plaats	
Land	
Contactpersoon	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

60min wanddoorvoer : 1

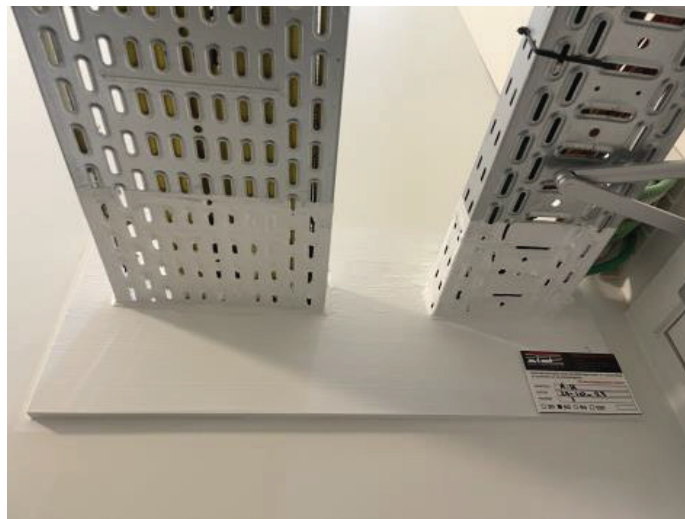


1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied
- positie omschrijving
Trappenhuis
- status
Afgerond
- materiaal doorvoer
Kabelgoten / Kabelladders
- ruimte om de doorvoering
> 40mm ruimte om de kabelgoot
montage in de sparing
- Afmeting Kabelgoot/ kabelladder
200 x 60, 300 x 60
- Applicatie omschrijving
2 lagen FB750 Brandwerende
Steenwolplaat op maat snijden en
zijanten van FS702 Brandwerende
Acrylaatproducten. De 2 lagen
FB750 Brandwerende Steenwolplaat
in het midden van de sparing
plaatsen. Kabelgoot, kabels
afdichten en de aansluiting tussen
de FB750 Brandwerende
Steenwolplaten en de wand
afdichten en met FS702
Brandwerende Acrylaatkit aan beide
zijden van de wand. FI025
Isolatiedeken aan beide zijden van
de wand om de kabelgoot wikkelen.

60min wanddoorvoer : 2





1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied
- positie omschrijving
Trappenhuis
- status
Afgerond
- materiaal doorvoer
Kabelgoten / Kabelladders
- ruimte om de doorvoering
> 40mm ruimte om de kabelgoot
montage in de sparing
- Afmeting Kabelgoot/ kabelladder
200 x 60, 300 x 60
- Applicatie omschrijving
2 lagen FB750 Brandwerende
Steenwolplaat op maat snijden en
zijanten van FS702 Brandwerende
Acrylaatproducten. De 2 lagen
FB750 Brandwerende Steenwolplaat
in het midden van de sparing
plaatsen. Kabelgoot, kabels
afdichten en de aansluiting tussen
de FB750 Brandwerende
Steenwolplaten en de wand
afdichten en met FS702
Brandwerende Acrylaatkit aan beide
zijden van de wand. FI025
Isolatiedeken aan beide zijden van
de wand om de kabelgoot wikkelen.

60min wanddoorvoer : 3



1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Lifthal
status Afgerond
materiaal doorvoer Bundel losse kabels en E-leidingen
afmeting sparing om de doorvoeringen 10 t/m 50mm ruimte tussen kabels en constructie
aantal Kabels 2 stuks
Applicatie omschrijving Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de kabelgoot en in de kabelgoot (ook tussen de kabels) vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit, kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 4

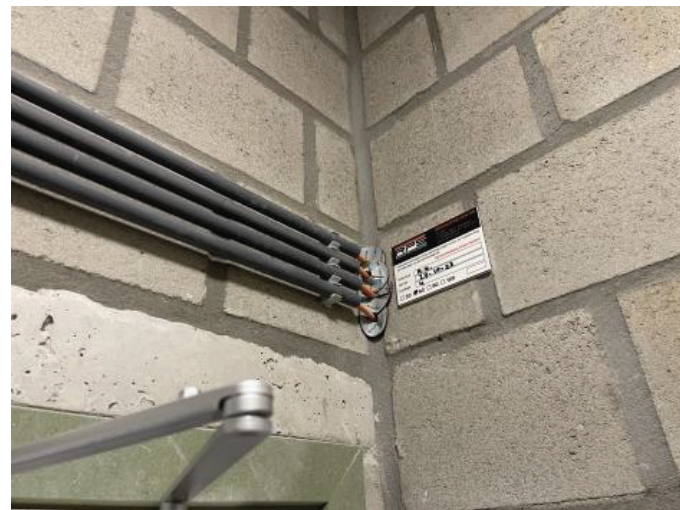



1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Lifthal
status Afgerond
materiaal doorvoer Bundel losse kabels en E-leidingen
afmeting sparing om de doorvoeringen 10 t/m 50mm ruimte tussen kabels en constructie
aantal Kabels 4 stuks
Applicatie omschrijving Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de kabelgoot en in de kabelgoot (ook tussen de kabels) vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit, kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 5




1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied
- positie omschrijving
Parkeergarage
- status
Afgerond
- materiaal doorvoer
Kabelgoten / Kabelladders
- ruimte om de doorvoering
**> 40mm ruimte om de kabelgoot
montage in de sparing**
- Afmeting Kabelgoot/ kabelladder
200 x 60, 300 x 60
- Applicatie omschrijving
**2 lagen FB750 Brandwerende
Steenwolplaat op maat snijden en
zijkanen van FS702 Brandwerende
Acrylaatproducten. De 2 lagen
FB750 Brandwerende Steenwolplaat
in het midden van de sparing
plaatsen. Kabelgoot, kabels
afdichten en de aansluiting tussen
de FB750 Brandwerende
Steenwolplaten en de wand
afdichten en met FS702
Brandwerende Acrylaatkit aan beide
zijden van de wand. FI025
Isolatiedeken aan beide zijden van
de wand om de kabelgoot wikkelen.**

60min wanddoorvoer : 6




1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied
- positie omschrijving
Plafond garage
- status
Afgerond
- materiaal doorvoer
Kunststof buis tot Ø 125mm
- afmeting sparing
kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
- Isolatie
Ongeïsoleerd
- Verwerkingsinstructie
**Door muur: gips / metalstud / steen,
minimaal 100 mm dik, 2-zijdig
afdichten. De buisdiameters tot Ø
125 mm afdichten met Nullifire
FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan
beide zijden van de doorvoer
rondom de kunststof buis PR101
Rugvulling aanbrengen en 25 mm in
de doorvoer schuiven. FS709
Brandwerende Grafietkit geheel
rondom de buis aanbrengen.
minimaal 25 mm diep aan beide
zijden van de wand.
[https://www.nullifire.com/nl_NL/tec
hnische-
zone/adviestool/masievewand-
kunststof-buis/](https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/)**

60min wanddoorvoer : 7

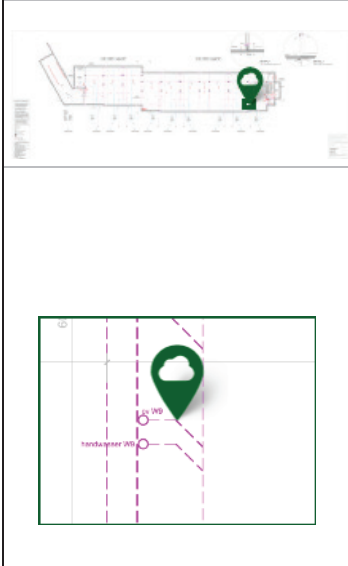


1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Bundel losse kabels en E-leidingen, Meerlagen alupex buis
afmeting sparing om de doorvoeringen 10 t/m 50mm ruimte tussen kabels en constructie
aantal Kabels 5 stuks
Applicatie omschrijving Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de kabelgoot en in de kabelgoot (ook tussen de kabels) vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit. kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 8

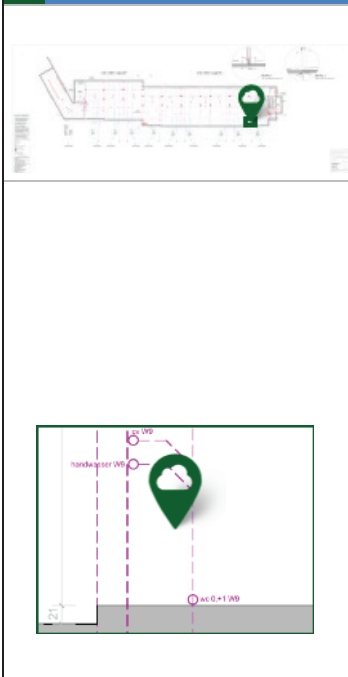


1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
Isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 9




1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
Isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviesstof/masievewand-kunststof-buis

60min wanddoorvoer : 10

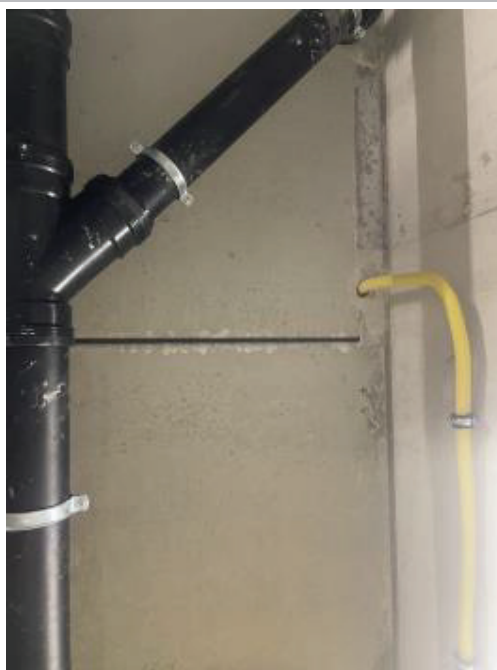



1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm, Meerlagen alupex buis
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
Isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviesstof/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 11




1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Bundel losse kabels en E-leidingen, Meerlagen alupex buis
afmeting sparing om de doorvoeringen 10 t/m 50mm ruimte tussen kabels en constructie
aantal Kabels 3 stuks
Applicatie omschrijving Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de kabelgoot en in de kabelgoot (ook tussen de kabels) vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit, kitdiepte 25 mm aan beide zijden,
afmeting sparing kleine sparing vanaf 12 t/m 50mm
Verwerkingsinstructie Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de Alupex buis vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit, kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 12




1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Meerlagen alupex buis
afmeting sparing kleine sparing vanaf 12 t/m 50mm
Verwerkingsinstructie Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de Alupex buis vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit, kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 13



1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
Isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 14




1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
Isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/



RPS BV


Leuwerbroek 2060 B I 3640 Kinrooi I T. +32 (0)495 49 05 21 I info@r-p-s.be I www.rpsbenelux.com I BTW BE 0607 905 532 I KBC BE80 7340 4040 7377

60min wanddoorvoer : 15





1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviesstof/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 16



1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviesstof/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 17

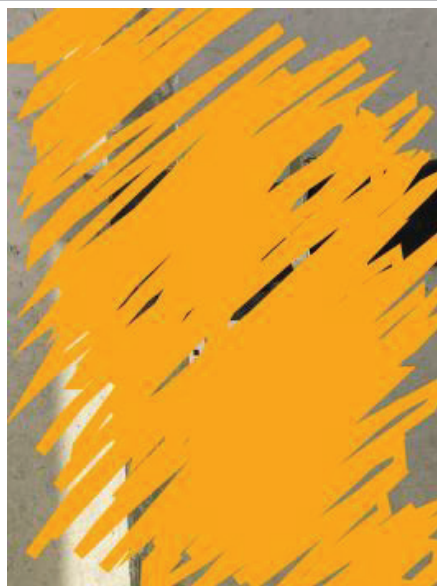


1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 18



1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Bundel losse kabels en E-leidingen
afmeting sparing om de doorvoeringen 10 t/m 50mm ruimte tussen kabels en constructie
aantal Kabels 3 stuks
Applicatie omschrijving Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de kabelgoot en in de kabelgoot (ook tussen de kabels) vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit. kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 19

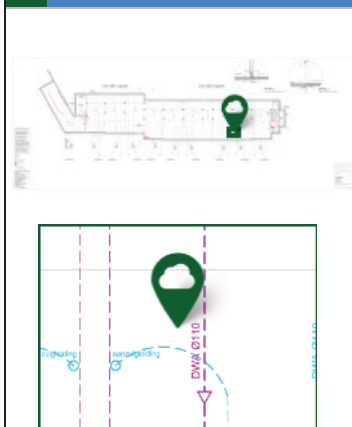

1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied

positie omschrijving
Plafond parkeergarage


status
Afgerond

materiaal doorvoer
Meerlagen alupex buis

afmeting sparing
kleine sparing vanaf 12 t/m 50mm

Verwerkingsinstructie
Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de Alupex buis vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit, kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 20

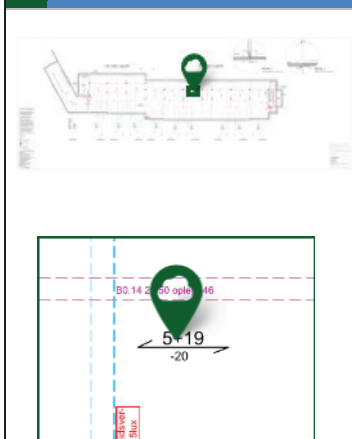

1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied

positie omschrijving
Plafond parkeergarage

status
Afgerond

materiaal doorvoer
Kunststof buis tot 0 t/m 125mm

afmeting sparing
kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm

Isolatie
Ongeïsoleerd

Verwerkingsinstructie
Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand.
https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviesetool/masievewand-kunststof-buis/

RPS BV

Leuwerbroek 2060 B I 3640 Kinrooi I T. +32 (0)495 49 05 21 I info@r-p-s.be I www.rpsbenelux.com I BTW BE 0607 905 532 I KBC BE80 7340 4040 7377


RPS
RESEARCH & PROTECTION SOLUTIONS
FOR WATERPROOFING

60min wanddoorvoer : 21



1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 22



1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Bundel losse kabels en E-leidingen, Meerlagen alupex buis
afmeting sparing om de doorvoeringen 10 t/m 50mm ruimte tussen kabels en constructie
aantal Kabels 6 stuks
Applicatie omschrijving Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de kabelgoot en in de kabelgoot (ook tussen de kabels) vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit. kitdiepte 25 mm aan beide zijden,
afmeting sparing kleine sparing vanaf 12 t/m 50mm
Verwerkingsinstructie Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de Alupex buis vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit. kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 23




1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
Isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

RPS BV

Leuwerbroek 2060 B I 3640 Kinrooi I T. +32 (0)495 49 05 21 I info@r-p-s.be I www.rpsbenelux.com I BTW BE 0607 905 532 I KBC BE80 7340 4040 7377

60min wanddoorvoer : 24



1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving
Plafond parkeergarage
status
Afgerond
materiaal doorvoer
Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing
kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
Isolatie
Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie
Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen, minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand.
https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 25



1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving
Plafond parkeergarage
status
Afgerond
materiaal doorvoer
Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing
kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
Isolatie
Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie
Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen, minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand.
https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 26




1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot Ø t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
Isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metaalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 27




1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot Ø t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
Isolatie Geïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metaalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 28



1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Bundel losse kabels en E-leidingen
afmeting sparing om de doorvoeringen 10 t/m 50mm ruimte tussen kabels en constructie
aantal Kabels 8 stuks
Applicatie omschrijving Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de kabelgoot en in de kabelgoot (ook tussen de kabels) vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit. kitdiepte 25 mm aan beide zijden,
Isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 29



1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied

positie omschrijving
Plafond parkeergarage

status
Afgerond


materiaal doorvoer
Kunststof buis tot 0 t/m 125mm

afmeting sparing
kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm

Isolatie
Ongeïsoleerd

Verwerkingsinstructie
Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand.
https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviesstof/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 30



1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied

positie omschrijving
Plafond parkeergarage

status
Afgerond

materiaal doorvoer
Kunststof buis tot 0 t/m 125mm

afmeting sparing
kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm

Isolatie
Ongeïsoleerd


Verwerkingsinstructie
Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand.
https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviesstof/masievewand-kunststof-buis/



RPS BV

Leuvenbroek 2060 B I 3640 Kinrooi I T. +32 (0)495 49 05 21 I info@r-p-s.be I www.rpsbenelux.com I BTW BE 0607 905 532 I KBC BE80 7340 4040 7377

60min wanddoorvoer : 31



1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied

positie omschrijving
Plafond parkeergarage

status
Afgerond

materiaal doorvoer
Meerlagen alupex buis

afmeting sparing
kleine sparing vanaf 12 t/m 50mm

Verwerkingsinstructie
Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de Alupex buis vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit, kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 32



1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied

positie omschrijving
Plafond parkeergarage

status
Afgerond

materiaal doorvoer
Kunststof buis tot 0 t/m 125mm

afmeting sparing
kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm

Isolatie
Ongeïsoleerd

Verwerkingsinstructie
Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand.
https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/



RPS BV


Leuwerbroek 2060 B I 3640 Kinrooi I T. +32 (0)495 49 05 21 I info@r-p-s.be I www.rpsbenelux.com I BTW BE 0607 905 532 I KBC BE80 7340 4040 7377

60min wanddoorvoer : 33




1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 34




1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Bundel losse kabels en E-leidingen, Meerlagen alupex buis
afmeting sparing om de doorvoeringen 10 t/m 50mm ruimte tussen kabels en constructie
aantal Kabels 7 stuks
Applicatie omschrijving Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de kabelgoot en in de kabelgoot (ook tussen de kabels) vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit. kitdiepte 25 mm aan beide zijden,
Isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/
afmeting sparing kleine sparing vanaf 12 t/m 50mm
Verwerkingsinstructie Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de Alupex buis vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit. kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 35

 		1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied positie omschrijving Plafond parkeergarage status Afgerond materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm Isolatie Ongeïsoleerd Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/
--	--	--

60min wanddoorvoer : 36

 		1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied positie omschrijving Plafond parkeergarage status Afgerond materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm Isolatie Ongeïsoleerd Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/
--	--	--

60min wanddoorvoer : 37





1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 38



1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Meerlagen alupex buis
afmeting sparing kleine sparing vanaf 12 t/m 50mm
Verwerkingsinstructie Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de Alupex buis vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit. kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 39

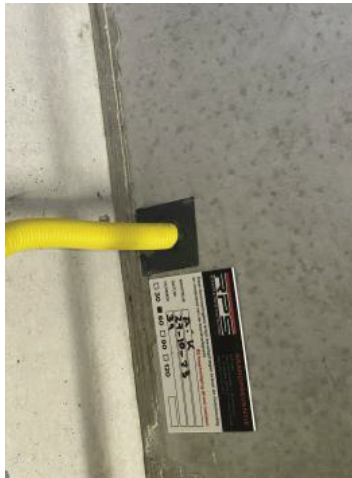

1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied

positie omschrijving
Plafond parkeergarage


status
Afgerond

materiaal doorvoer
Meerlagen alupex buis

afmeting sparing
kleine sparing vanaf 12 t/m 50mm

Verwerkingsinstructie
Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de Alupex buis vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit. kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 40



1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied

positie omschrijving
Plafond parkeergarage

status
Afgerond

materiaal doorvoer
Bundel losse kabels en E-leidingen

afmeting sparing om de doorvoeringen
10 t/m 50mm ruimte tussen kabels en constructie

aantal Kabels
8 stuks


Applicatie omschrijving
Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de kabelgoot en in de kabelgoot (ook tussen de kabels) vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit. kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 41




1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviesstool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 42



1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
isolatie Geïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviesstool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 43




1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 44



1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Meerlagen alupex buis
afmeting sparing kleine sparing vanaf 12 t/m 50mm
Verwerkingsinstructie Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de Alupex buis vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit. kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 45



1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied

positie omschrijving
Plafond parkeergarage


status
Afgerond

materiaal doorvoer
Meerlagen alupex buis

afmeting sparing
kleine sparing vanaf 12 t/m 50mm

Verwerkingsinstructie
Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de Alupex buis vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit. kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 45



1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied

positie omschrijving
Plafond parkeergarage

status
Afgerond


materiaal doorvoer
Bundel losse kabels en E-leidings

afmeting sparing om de doorvoeringen
10 t/m 50mm ruimte tussen kabels en constructie

aantal Kabels
6 stuks


Applicatie omschrijving
Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de kabelgoot en in de kabelgoot (ook tussen de kabels) vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit. kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 47

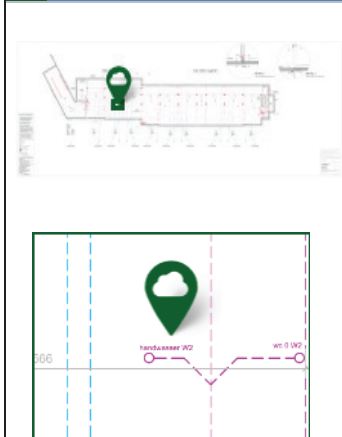

1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 48

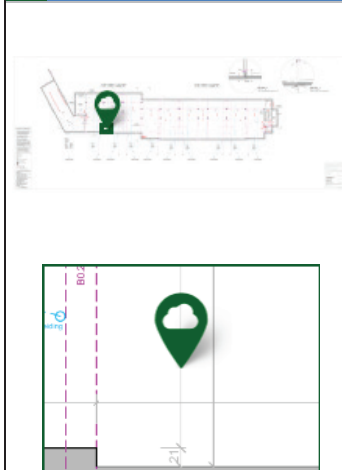

1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Bundel losse kabels en E-leidingen
afmeting sparing om de doorvoeringen 10 t/m 50mm ruimte tussen kabels en constructie
aantal Kabels 7 stuks
Applicatie omschrijving Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de kabelgoot en in de kabelgoot (ook tussen de kabels) vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit. kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 49



1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied

positie omschrijving
Plafond parkeergarage



status
Afgerond

materiaal doorvoer
Meerlagen alupex buis

afmeting sparing
kleine sparing vanaf 12 t/m 50mm

Verwerkingsinstructie
Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de Alupex buis vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit, kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 50



1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied

positie omschrijving
Plafond parkeergarage


status
Afgerond

materiaal doorvoer
Meerlagen alupex buis

afmeting sparing
kleine sparing vanaf 12 t/m 50mm

Verwerkingsinstructie
Steenwolrugvulling 33 kg/3, 50 mm dik aanbrengen in het midden van de doorvoer. Zowel rond de kabelgoot als in de kabelgoot. Goed aandrukken. Aan beide zijden van de doorvoer heel de ruimte om de Alupex buis vullen met FS709 Brandwerende Grafietkit, kitdiepte 25 mm aan beide zijden,

60min wanddoorvoer : 51



1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied

positie omschrijving
Plafond parkeergarage

status
Afgerond


materiaal doorvoer
Kunststof buis tot 0 t/m 125mm

afmeting sparing
kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm

Isolatie
Ongeïsoleerd

Verwerkingsinstructie
Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand.
https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 52



1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied

positie omschrijving
Plafond parkeergarage

status
Afgerond

materiaal doorvoer
Kunststof buis tot 0 t/m 125mm

afmeting sparing
kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm

Isolatie
Ongeïsoleerd


Verwerkingsinstructie
Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand.
https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/



RPS BV



Leuwerbroek 2060 B I 3640 Kinrooi I T. +32 (0)495 49 05 21 I info@r-p-s.be I www.rpsbenelux.com I BTW BE 0607 905 532 I KBC BE80 7340 4040 7377

60min wanddoorvoer : 53





1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
Isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviesstof/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 54




1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Wand doorvoer technische ruimte
status Afgerond
materiaal doorvoer Kabelgoten / Kabelladders, Kunststof buis tot Ø 125mm
ruimte om de doorvoering > 40mm ruimte om de kabelgoot montage in de sparing
Applicatie omschrijving 2 lagen FB750 Brandwerende Steenwolplaat op maat snijden en zijkanalen van FS702 Brandwerende Acrylaatproducten. De 2 lagen FB750 Brandwerende Steenwolplaat in het midden van de sparing plaatsen. Kabelgoot, kabels afdichten en de aansluiting tussen de FB750 Brandwerende Steenwolplaten en de wand afdichten en met FS702 Brandwerende Acrylaatkit aan beide zijden van de wand. FI025 Isolatievulling aan beide zijden van de wand om de kabelgoot wikkelen.
afmeting sparing Ruime sparing > 50
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen, minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/advies/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 55




1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Wand technische ruimte
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
Isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 56



1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Wand doorvoer technische ruimte
status Afgerond
materiaal doorvoer Kabelgoten / Kabelladders
ruimte om de doorvoering > 40mm ruimte om de kabelgoot montage in de sparing
Afmeting Kabelgoot/ kabelladder 100 x 60, 400 x 60
Applicatie omschrijving 2 lagen FB750 Brandwerende Steenwolplaat op maat snijden en zijkanen van FS702 Brandwerende Acrylaatproducten. De 2 lagen FB750 Brandwerende Steenwolplaat in het midden van de sparing plaatsen. Kabelgoot, kabels afdichten en de aansluiting tussen de FB750 Brandwerende Steenwolplaten en de wand afdichten en met FS702 Brandwerende Acrylaatkit aan beide zijden van de wand. FI025 Isolatieleden aan beide zijden van de wand om de kabelgoot wikkelen.

60min wanddoorvoer : 57



1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied

positie omschrijving
Wand doorvoer technische ruimte

status
Afgerond


materiaal doorvoer
Kunststof buis tot 0 t/m 125mm

afmeting sparing
kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm

Isolatie
Ongeïsoleerd

Verwerkingsinstructie
Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand.
https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 58



1. naam applicateur
RPS bv - Arief Wazied

positie omschrijving
Plafond technische ruimte

status
Afgerond

materiaal doorvoer
Kunststof buis tot 0 t/m 125mm

afmeting sparing
kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm

Isolatie
Ongeïsoleerd



Verwerkingsinstructie
Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand.
https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/



RPS BV


Leuwerbroek 2060 B I 3640 Kinrooi I T. +32 (0)495 49 05 21 I info@r-p-s.be I www.rpsbenelux.com I BTW BE 0607 905 532 I KBC BE80 7340 4040 7377

60min wanddoorvoer : 59



1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond technische ruimte
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

60min wanddoorvoer : 60




1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
Isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/



RPS BV

Leuwerbroek 2060 B I 3640 Kinrooi I T. +32 (0)495 49 05 21 I info@r-p-s.be I www.rpsbenelux.com I BTW BE 0607 905 532 I KBC BE80 7340 4040 7377

60min wanddoorvoer : 61



1. naam applicateur RPS bv - Arief Wazied
positie omschrijving Plafond parkeergarage
status Afgerond
materiaal doorvoer Kunststof buis tot 0 t/m 125mm
afmeting sparing kleine sparing vanaf 20 t/m 50mm
isolatie Ongeïsoleerd
Verwerkingsinstructie Door muur: gips / metalstud / steen, minimaal 100 mm dik, 2-zijdig afdichten. De buisdiameters tot Ø 125 mm afdichten met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit. Aan beide zijden van de doorvoer rondom de kunststof buis PR101 Rugvulling aanbrengen en 25 mm in de doorvoer schuiven. FS709 Brandwerende Grafietkit geheel rondom de buis aanbrengen. minimaal 25 mm diep aan beide zijden van de wand. https://www.nullifire.com/nl_NL/technische-zone/adviestool/masievewand-kunststof-buis/

Technische documentatie en rapporten

Op deze pagina treft u alle Nullifire producten aan die in dit project toegepast zijn voor het gecertificeerd brandwerend afdichten van sparingen in combinatie met installatiedoorroeringen.

Van al deze producten heeft Nullifire technische documentatie en rapporten die onder andere bestaan uit:

Productbladen:

- [Nullifire FS702 - Brandwerende acrylaatkit](#)
- [Nullifire FS709 - Brandwerende grafietkit](#)
- [Nullifire FS712 - Brandwerende acrylaatcoating](#)
- [Nullifire FB750 - Brandwerende steenwolplaat](#)

ETA-Rapporten:

- [Nullifire FS702 - Brandwerende acrylaatkit](#)
- [Nullifire FS709 - Brandwerende grafietkit](#)
- [Nullifire FS712 - Brandwerende acrylaatcoating](#)
- [Nullifire FB750 - Brandwerende steenwolplaat](#)

Veiligheidsattesten:

- [Nullifire FS702 - Brandwerende acrylaatkit](#)
- [Nullifire FS709 - Brandwerende grafietkit](#)
- [Nullifire FS712 - Brandwerende acrylaatcoating](#)
- [Nullifire FB750 - Brandwerende steenwolplaat](#)

Technische fiches:

- [Nullifire FS702 - Brandwerende acrylaatkit](#)
- [Nullifire FS709 - Brandwerende grafietkit](#)
- [Nullifire FB750 - Brandwerende steenwolpaat](#)

Er kunnen wijzigingen in documenten plaatsvinden. Daarom verwijzen wij u, via bovenstaande download button(s), naar de download pagina op de website van Nullifire, waar altijd de actuele technische documenten en rapporten te vinden zijn.



RPS BV

Leuerbroek 2060 B I 3640 Kinrooi I T. +32 (0)495 49 05 21 I info@r-p-s.be I www.rpsbenelux.com I BTW BE 0607 905 532 I KBC BE80 7340 4040 7377

Passage Boutersem



Over Nullifire

Al meer dan 45 jaar ontwikkelt Nullifire slimme brandwerende oplossingen. Nullifire is specialist met een doel dat sinds die tijd niet is veranderd en niet zal veranderen: het beschermen van mensen en hun eigendommen tegen brand en het beperken van bedrijfsrisico's.

Vandaag de dag biedt Nullifire een uitgebreid assortiment aan brandwerende afdichtingsproducten voor voegen en doorvoeren, en brandwerende staalcoatings in bouwkundige constructies, die door heel Europa worden toegepast. Het begon in het Verenigd Koninkrijk in 1973 toen Nullifire werd opgericht na de invoering van de Fire Precaution Act.

In de loop van 10 jaar introduceerde Nullifire een reeks opschuimende technologieën voor de bescherming van zowel houten- als stalen constructies. Daarnaast heeft Nullifire een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van brandbeveiligingsoplossingen voor doorvoeren en bewegingsvoegen in de bouw.

Dit heeft onder andere de basis gelegd voor de coatings die Nullifire vandaag de dag produceert. De technologie is sindsdien geëvolueerd, maar de algemene principes gelden vandaag de dag nog steeds. En dat geldt ook voor hun onveranderde focus op de bescherming van mensen en hun eigendommen.

Tremco CPG Netherlands B.V.
P.O. box 20, 4240 CA Arkel
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel

Nullifire

RPS
RESEARCH & PROTECTION SOLUTIONS
FOR WATERPROOFING

RPS BV

Leuwerbroek 2060 B I 3640 Kinrooi I T. +32 (0)495 49 05 21 I info@r-p-s.be I www.rpsbenelux.com I BTW BE 0607 905 532 I KBC BE80 7340 4040 7377

